



一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

# 建設工事だより

令和4年  
10月号



発行日: 令和4年10月

発行者: 日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修: 能代山本広域市町村圏組合

## 造成工事本格化

現在、建設予定地の造成工事として切土・盛土工事が本格的に行われています。西側の浸透調整池・浸透性側溝工事が完了し、東側の浸透側溝工事・土壁補強工事を開始しました。また、取付道路の拡幅工事を行っていきます。

### ■工事工程 (工事期間: 令和4年6月～令和8年3月)

【工事工程】	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			R8年度				
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
準備工事	伐採、伐根、造成工事												新施設稼働				
土木・建築工事	土木・建築工事																
プラント設備工事	プラント設備工事																
試運転	試運転																


◎令和4年1月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

### ■工事進捗状況 (令和4年10月1日現在)



【西】

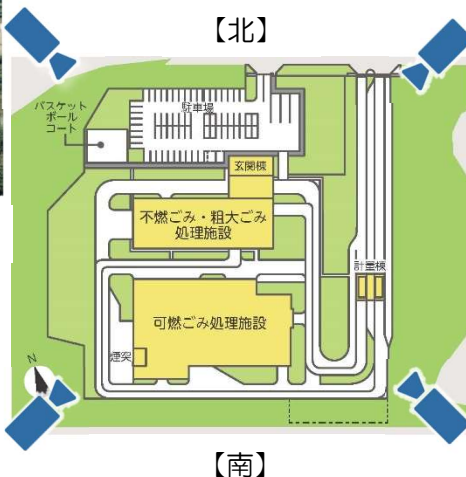

【東】



【南】



【北】

### ■工事内容 (令和4年10月)



① 取付道路拡幅部の既存電柱移設が完了して、拡幅の準備を開始しました。



② 施設内の造成切盛工が進んでいます。

### ■11月の工事予定

施設内浸透側溝敷設・整地仕上げ及び101号線取合いの拡幅工事が主な作業となります。

