



一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

建設工事だより

令和5年
6月号



完成イメージ図

発行日：令和5年6月

発行者：日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合

可燃ごみ処理施設のごみピット掘削工事開始

可燃ごみ処理施設のごみピット部の山留親杭打設工事が完了し、引続き掘削工事を開始しました。

工程 (工事期間：令和4年6月～令和8年3月)

《工事工程》	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			R8年度		
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
準備工事	伐採、伐根、造成工事						造成工事						新施設稼働		
土木・建築工事							土木・建築工事								
プラント設備工事							プラント設備工事								
試運転													試運転		


◎令和4年11月1日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■工事進捗状況 (令和5年6月1日現在)



【西】

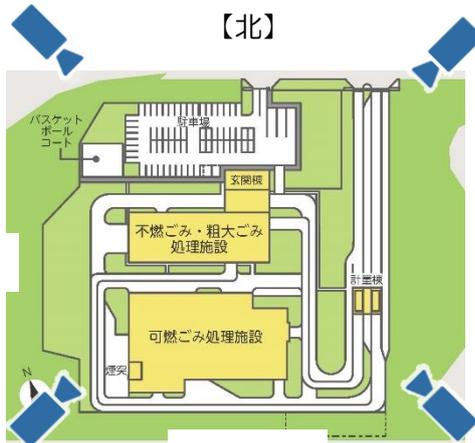

【東】



【南】



■工事内容 (令和5年6月)



① 不燃ごみ・粗大ごみ
処理施設
山留親杭打設工事
施工状況



② 可燃ごみ処理施設
ごみピット掘削工事
施工状況

■6月の工事予定

可燃ごみ処理施設のごみピット部の掘削工事を開始し、6月中頃より炉室部の基礎工事として柱状改良工事を開始します。また、不燃ごみ・粗大ごみ処理施設において、山留親杭打設工事を施工し、7月からの柱状改良工事の準備を始めます。

