

一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

建設工事だより

令和5年
11月号



完成イメージ図

発行日: 令和5年 11 月

発行者: 日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修: 能代山本広域市町村圏組合

可燃ごみ処理施設 ごみピット部掘削完了

可燃ごみ処理施設は、ごみピット部の掘削工事が完了、底盤の躯体工事に移行します。

不燃ごみ・粗大ごみ処理施設において、基礎・躯体工事を開始しました。

工程 (工事期間: 令和4年6月～令和8年3月)

《工事工程》	令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				R8年度				
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
準備工事	伐採、伐根、造成工事												造成工事			新施設稼働					
土木・建築工事	土木・建築工事												土木・建築工事			新施設稼働					
プラント設備工事	プラント設備工事												プラント設備工事			新施設稼働					
試運転	試運転												試運転			新施設稼働					


◎令和4年11月1日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■工事進捗状況 (令和5年11月2日現在)



【西】

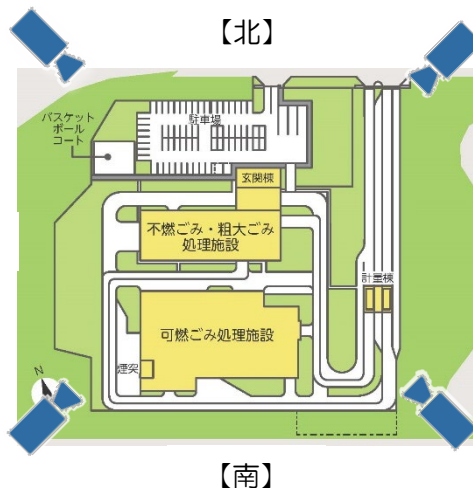

【東】



■工事内容 (令和5年11月)



① 不燃ごみ・粗大ごみ
処理施設

基礎部アンカーフ
レーム・配筋施工状況



② 可燃ごみ処理施設

ごみピット掘削完了
底盤部砕石地業施工
状況

■12月の工事予定

可燃ごみ処理施設では、ごみピット部底盤躯体工事、炉室部プラント機械基礎と建屋基礎工事を継続します。
不燃ごみ・粗大ごみ処理施設では、基礎躯体工事を継続します。

