

一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

建設工事だより

令和5年
9月号

発行日：令和5年9月

発行者：日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合



完成イメージ図

ごみピット最終掘削へ 基礎・躯体工事開始

可燃ごみ処理施設は、ごみピット部三次掘削の最終段階に進み、プラント機械基礎と躯体工事を開始しました。

不燃ごみ・粗大ごみ処理施設においても基礎部の掘削工事に進みました。

工程 (工事期間：令和4年6月～令和8年3月)

《工事工程》	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			R8年度		
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
準備工事	伐採、伐根、造成工事						造成工事						新施設稼働		
土木・建築工事							土木・建築工事								
プラント設備工事							プラント設備工事								
試運転													試運転		

◎令和4年11月1日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。


■工事進捗状況 (令和5年8月31日現在)



【西】



【南】

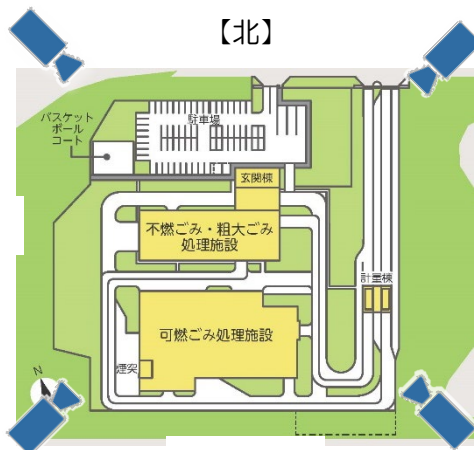

【東】



【北】

■工事内容 (令和5年9月)



① 不燃ごみ・粗大ごみ
処理施設

基礎部掘削工事
施工状況



② 可燃ごみ処理施設

ごみピット三次掘削
工事施工状況

■10月の工事予定

可燃ごみ処理施設では、ごみピット部の三次掘削工事、プラント機械基礎と躯体工事を継続します。不燃ごみ・粗大ごみ処理施設では、土工事・機械基礎工事を継続で行い、月末には基礎躯体工事に移行します。

