



一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

建設工事だより

令和5年
5月号

発行日：令和5年5月

発行者：日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合



完成イメージ図

可燃ごみ処理施設の建築工事開始

4月初めより建築工事の準備作業が始まり、続いて可燃ごみ処理施設ごみピットの山留親杭打設工事を開始しました。

工程 (工事期間：令和4年6月～令和8年3月)

《工事工程》	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			R8年度		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備工事	伐採、伐根、造成工事						造成工事						新施設稼働		
土木・建築工事							土木・建築工事								
プラント設備工事							プラント設備工事								
試運転													試運転		


◎令和4年11月1日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■工事進捗状況 (令和5年5月2日現在)



【西】

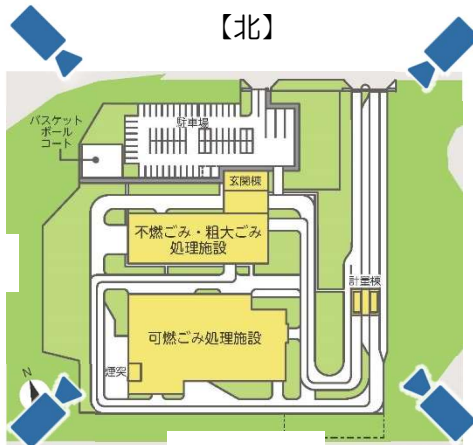

【東】



【南】



■工事内容 (令和5年5月)



① 構内仮設通路の敷き鉄板敷設状況



② 可燃ごみ処理施設ごみピットの山留親杭打設工事状況

■5月の工事予定

可燃ごみ処理施設ごみピットの山留親杭打設工事後、引き続き、不燃ごみ・粗大ごみ処理施設の山留親杭打設工事に移行します。また、可燃ごみ処理施設の地業工事として柱状改良杭の施工を開始します。

